


Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería y Calidad de Software



Trabajo Práctico Evaluable N.º 7

SCRUM - Ejercicio de aplicación

Año: 2026

Docentes: Ing. Laura Covaro, Ing. Cecilia Massano, Ing. Constanza Garnero, Ezequiel Izaguirre

Curso: 4K3

Grupo Nro: 8

Integrantes:

- ULIANA, Agustin – 97828
- LEDO FLORES, Francisco – 86489
- CASTELO, Matias – 88413
- DIAZ, Ivan – 87473
- SORUCO, Jonatan – 79456
- GIAIMO, Gino – 78426
- PÁEZ DE LA TORRE, Matias – 83289
- RAMALLO, Mateo – 94441
- CORREA, Jeremías – 88714
- VARGAS FERNANDEZ, Rodrigo – 96417
- FORTI, Bruno – 80818
- TRONCOZO, Valentina – 86268
- LEYES MOLINA, Selene – 65743
- CARDOZO ROJAS, Fernando – 89064

Fecha de Entrega: 24/09

Índice

SCRUM: Estimación, Sprints y Velocidad del Equipo.....	3
1. Estimación en Story Points.....	3
2. Capacidad del equipo y resultados por sprint.....	3
3. Tablero Kanban — evolución por sprint.....	4
4. Cálculo de la velocidad del equipo.....	5
5. Registro fotográfico de las US realizadas.....	5

SCRUM: Estimación, Sprints y Velocidad del Equipo

Proyecto: Parque de diversiones — Prototipos de atracciones en miniatura

1. Estimación en Story Points

User Story	Story Points
Rueda de la fortuna	8
Montaña rusa	8
Calesita	5
Hamacas (x2)	3
Autos chocadores	2
Casa del terror	1
Total Product Backlog	27 SP

2. Capacidad del equipo y resultados por sprint

Capacidad estimada del equipo: 9 SP por sprint.

Sprint	SP Completados	Historias completadas
Sprint 1	0 SP	— (ninguna atracción finalizada)
Sprint 2	9 SP	Montaña rusa (8 SP), Casa del terror (1 SP)
Sprint 3 (final)	18 SP	Rueda de la fortuna (8 SP), Autos chocadores (2 SP), Hamacas (3 SP), Calesita (5 SP)
Total	27 SP	Backlog completo (6 de 6 historias)

3. Tablero Kanban — evolución por sprint

Estado del tablero al finalizar el Sprint 1 (0 SP completados, el backlog permanece intacto):

Product Backlog	Sprint Backlog	WIP	Done
Rueda de la fortuna (8) Montaña rusa (8) Calesita (5) Hamacas (3) Autos chocadores (2) Casa del terror (1)	—	—	—

El equipo no dejó el Sprint 1 sin avance: se priorizó la preparación de materiales comunes y se inició el trabajo sobre las historias de mayor valor de negocio (Rueda de la fortuna y Montaña rusa), aunque ninguna llegó a cumplir la Definition of Done dentro del sprint.

Estado del tablero al finalizar el Sprint 2 (se completan Montaña rusa y Casa del terror, 9 SP):

Product Backlog	Sprint Backlog	WIP	Done
Rueda de la fortuna (8) Calesita (5) Hamacas (3) Autos chocadores (2)	—	—	Montaña rusa (8) Casa del terror (1) Acumulado: 9 SP

Estado del tablero al finalizar el Sprint 3 / final (se completa el resto del backlog, 18 SP más):

Product Backlog	Sprint Backlog	WIP	Done
—	—	—	Rueda de la fortuna (8) Montaña rusa (8) Calesita (5) Hamacas (3) Autos chocadores (2) Casa del terror (1) Acumulado: 27 SP

4. Cálculo de la velocidad del equipo

La velocidad del equipo se calcula como el promedio de Story Points completados por sprint:

Velocidad = (SP Sprint 1 + SP Sprint 2 + SP Sprint 3) / cantidad de sprints

Velocidad = (0 + 9 + 18) / 3 = 27 / 3 = 9 SP por sprint

La velocidad real del equipo (9 SP/sprint) coincide exactamente con la capacidad estimada inicialmente (9 SP), a pesar de que el ritmo no fue uniforme: el equipo no completó nada en el Sprint 1, alcanzó su capacidad plena en el Sprint 2 y superó el doble de su capacidad en el Sprint 3 para cerrar el backlog completo.

5. Registro fotográfico de las US realizadas

US4: Montaña rusa (completada en Sprint 2)




US3: Casa del terror (completada en Sprint 2)




US2: Autos chocadores (completada en Sprint 3)



US1: Rueda de la fortuna (completada en Sprint 3)

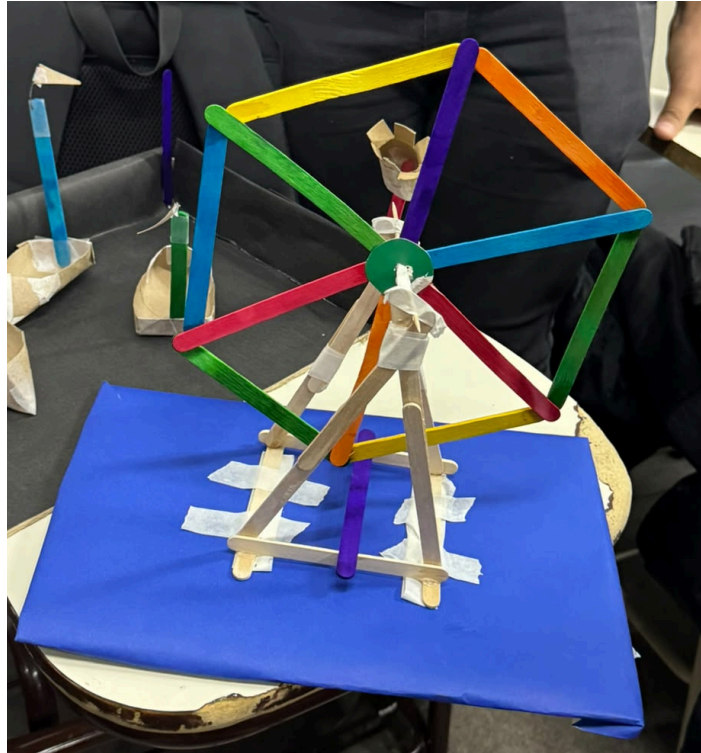

US6: Calesita (completada en Sprint 3)

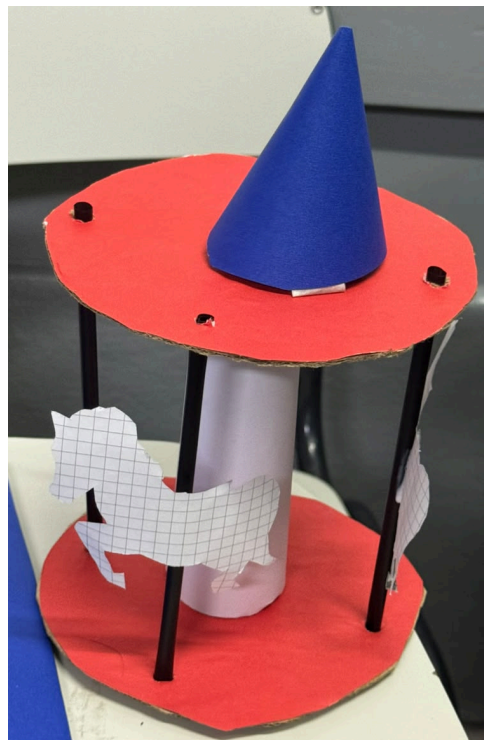

US5: Hamacas (completada en Sprint 3)

